




CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO

Via G. Mezzacapo, 36 - 84036 Sala Consilina (SA) - tel. 0975 21004 fax 0975 270049 - e-mail: info@bonificatanagro.it

REGOLAZIONE DEI DEFLUSSI DELLA PARTE ALTA DEL BACINO IDROGRAFICO
DEL FIUME TANAGRO E UTILIZZO DELLE ACQUE IN AGRICOLTURA:
PROGETTO DELLA DIGA DI CASALBUONO E SCHEMI IDRICI DI CONNESSIONE
IDRAULICA AI COMPENSORI IRRIGUI DEL VALLO DI DIANO,
DELL'ALTO BUSSENTO E DELLA PIANA DEL SELE - I LOTTO

STUDIO DI FATTIBILITA'

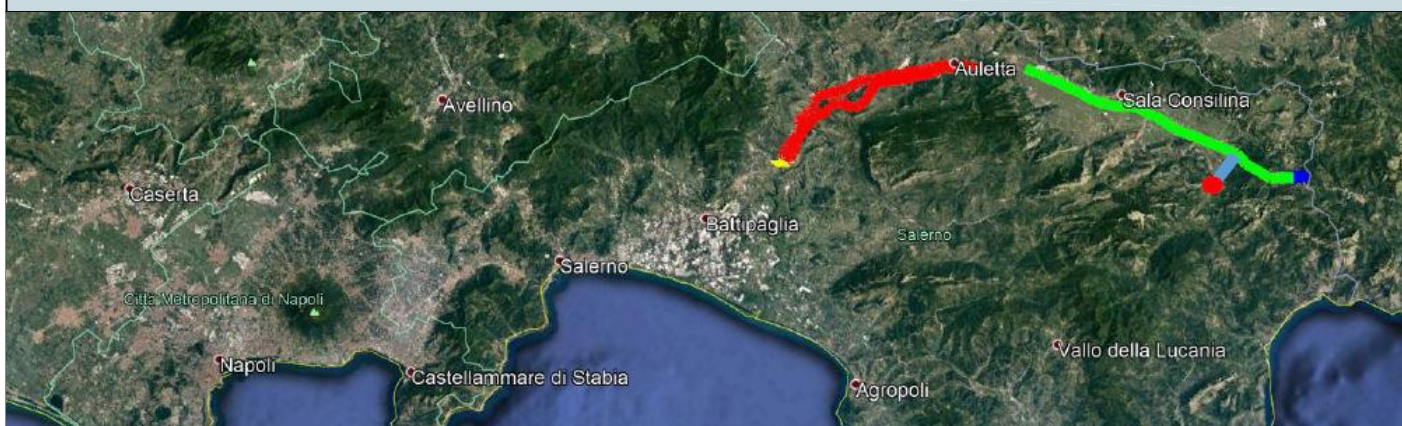

Progettazione Ufficio Tecnico Consortile

Gruppo di Progettazione - Ufficio Tecnico Consortile
ing. Mariano Lucio Alliegro (Coordinatore Progettista)
ing. Domenico Macellaro

Responsabile Unico del Procedimento
ing. Domenico Macellaro

Supporto tecnico esterno:
ing. Michele Vannata



ALLEGATO	ELABORATO	SCALA
4	CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO	-
DATA		
Dicembre 2020	Emissione	
Marzo 2022	Aggiornamento	



RIMODULAZIONE

mar-22

[illegible]



CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE

VALLO DI DIANO E TANAGRO

84036 - SALA CONSILINA (Salerno)

Via G. Mezzacapo, 39 - Tel. 0975-21004 - fax.0975-270049

Cod. Fisc. : 83002270656 - www.bonificatanagro.it E-mail: info@bonificatanagro.it



CSEI Catania

Centro Studi di Economia applicata all'Ingegneria Catania

Regolazione dei deflussi della parte alta del Bacino Idrografico del fiume Tanagro e utilizzo delle acque in agricoltura: Progetto Diga Casalbuono e Schema Idrico di connessione idraulica ai comprensori irrigui del Vallo di Diano, dell'Alto Bussento e della Piana del Sele - 1° LOTTO

CRONOPROGRAMMA PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA

N	DESCRIZIONE ATTIVITA'	anno 1°				anno 2°				anno 3°				anno 4°				anno 5°				anno 6°				anno 7°				anno 8°				anno 9°				anno 10°			
		1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre				
1	fase di progettazione ed acquisizione autorizzazioni, pareri e concessioni																																								
2	procedure espropriative																																								
3	fase di affidamento dei lavori																																								
4	aggiudicazione lavori e stipula contratto																																								
5	esecuzione lavori																																								
6	prove e collaudi																																								
7	esercizio di prova																																								
8	collaudo finale																																								
9	Rendicontazione intervento e chiusura attività																																								
